

# MANUEL DE MISE EN SERVICE

## SYSTEME DE DETECTION INCENDIE INTERACTIF

---



|                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| EH&S .....                                                                                         | 2  |
| Intervention sur une centrale .....                                                                | 3  |
| Généralités .....                                                                                  | 4  |
| Contrôles hors tension et câbles non raccordés .....                                               | 5  |
| Contrôles sous tension et câbles raccordés .....                                                   | 12 |
| Annexe – Méthodologie de prise de mesures Courant et Tension<br>sur alimentation et batterie ..... | 20 |
| Observations complémentaires .....                                                                 | 22 |



Ces exigences sont des exigences minimales.  
Si vous ne pouvez pas vous y conformer, vous ne devez pas commencer à travailler.

## > REGLE CARDINALE

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sécurité électrique</b>               | Des disjoncteurs différentiels 10 mA doivent être utilisés sur tout outillage ou équipement électrique portatif filaire utilisé en service / maintenance, ou pour des activités d'installation sur les sites clients et les sites Chubb France. |
| <b>Contrôle des énergies dangereuses</b> | Avant d'intervenir sur une machine ou un équipement, toutes les formes d'énergies dangereuses doivent être identifiées, neutralisées, et consignées.                                                                                            |
| <b>Intervention sur une centrale</b>     | Toute opération de maintenance ou réparation sur un équipement, autre que mesurage ou recherche de panne, doit se faire <b>équipement consigné</b> (mise à zéro de l'énergie électrique).                                                       |



Toutes mesures effectuées sur le domaine de tension supérieur au domaine TBT doit se faire en étant équipé de l'écran facial, du casque et des gants isolants.

## > PROCEDURE DE CONSIGNATION D'UN EQUIPEMENT

L'autorisation du client doit être obtenue avant toute consignation.

La procédure de consignation d'un équipement suit le déroulé des étapes ❶ à ❷ de la procédure décrite sur la page suivante.



**Il est obligatoire de procéder à une CONSIGNATION.**

L'étiquette d'identification apposée sur le cadenas (étape ❶) doit comporter les indications suivantes :


- nom,
- prénom,
- coordonnées téléphoniques, et
- la mention Chubb France.

Si le Client ou son **représentant** assure la consignation électrique de nos équipements, l'intervenant Chubb France doit impérativement suivre les procédures de consignation spécifiques au site sur lequel il intervient, et apposer son propre cadenas en plus de celui du client, grâce à l'outil de consignation multiple (disponible dans le kit de consignation BRADY).

Il procède à la vérification d'absence de tension à l'endroit où il va travailler (étape ❷)



# Intervention sur une centrale

|   | Action                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Matériel                                                                                                                                                                                                           | EPI spécifiques                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Vérifier que l'armoire métallique du disjoncteur n'est pas sous tension (courant de fuite)                                                                                                                                                                                                        | Détecteur de Tension sans contact                                                                                                                                                                                  | Lunettes anti-UV<br>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |
| 2 | Identification de l'organe de coupure                                                                                                                                                                                                                                                             | Plans ou indications client                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              |
| 3 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4 | <b>Effectuer la consignation :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ouvrir le disjoncteur</li> <li>Mettre en place l'accessoire de condamnation, la pancarte et le cadenas (rendre la clé inaccessible aux tiers)</li> </ul>                                                                | <b>Procédure dérogatoire pour intervention dans la centrale ou le coffret :</b><br>Débrochage du porte fusible (ouverture bipolaire Ph + N si possible) si coffret IP2X (rendre le fusible inaccessible aux tiers) | Cadenas Accessoires de condamnation<br><br>Etiquette d'identification<br> | Gants isolants 500 V (vérifier l'état avant chaque utilisation)<br>Lunettes anti-UV<br>Pince à bec isolée (procédure dérogatoire)<br><br> |
| 5 | <b>Vérifier l'absence de tension sur l'alimentation :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tester le VAT</li> <li>Vérifier l'absence de tension : Phase-Neutre + Phase-Terre + Neutre-Terre</li> <li>Re-tester le VAT</li> </ul>                                                            | VAT<br>                                                                                                                         | Gants isolants 500 V<br>Lunettes anti-UV                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |
| 6 | Vérifier l'absence d'autres énergies non identifiées (rajouts clients, tableau non IP2X et PNST accessibles ...)                                                                                                                                                                                  | Détecteur de Tension sans contact                                                                                                                                                                                  | Gants isolants 500 V<br>Lunettes anti-UV                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |
| 7 | Vérifier l'absence de risque de contact sur les bornes des batteries<br><i>Si risque de contact : veiller à éviter tout court-circuit (outil métallique...) et porter les gants isolants</i>                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                    | Lunettes anti-UV                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |
| 8 | <b>Procéder aux mesurages en Très Basse Tension (TBT)</b><br><br><b>Si voisinage de pièces nues sous tension &gt; 50 V, porter les gants isolants</b>                                                                                                                                             | Multimètre / Multimètre+ pince ampéremétrique<br><br>Multimètre / Multimètre+ pince ampéremétrique                              | Lunettes anti-UV<br><br>Lunettes anti-UV<br>Gants isolants 500 V                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9 | <b>Procéder à la déconsignation :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Retirer les accessoires de consignation</li> <li>Fermer le disjoncteur ou remettre le fusible en place</li> <li>Vérifier le bon fonctionnement de l'équipement</li> <li>Prévenir de la fin d'intervention</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                    | Lunettes anti-UV<br>Gants isolants 500 V si PNST dans le tableau où se situe l'organe de coupure                                                                                                                                            | Prévenir le client de la remise sous tension de l'équipement                                                                                                                                                                                                                                                    |

\* PNST = Pièce nue sous tension : conducteur actif avec lequel un contact direct est possible (indice de protection < IP2X, soit ouverture > 12 mm, correspondant au contact d'un doigt).

## > IDENTIFICATION DU SITE

| Renseignements relatifs à l'établissement |  |
|-------------------------------------------|--|
| Nom du site                               |  |
| Adresse                                   |  |
| Contacts                                  |  |
| Pour un ERP : Type(s) et catégorie        |  |
| Pour un autre établissement, description  |  |

| Renseignements relatifs à l'installation  |  |
|-------------------------------------------|--|
| Date de l'opération de la mise en service |  |

## > CONSIGNES GENERALES

Noter l'état de la centrale sur le registre de sécurité / carnet de suivi avant la mise en service.

Noter l'état de la centrale sur le registre de sécurité / carnet de suivi après la mise en service.

Rédiger toutes les observations constatées, durant la mise en service (*points réglementaires, techniques, commerciaux, etc.*).

**Nota** : Tout constat de l'état réel entraînant la nécessité de modifier l'installation doit être consigné dans le compte rendu adressé au chef d'établissement (NF S 61-933).

## > RECOMMANDATIONS

L'ensemble des contrôles hors ceux liés à l'alimentation doivent être effectués sur batterie



Ce document est applicable aux opérations de mise en service de la centrale.

Il décrit de façon détaillée le mode opératoire des différentes opérations liés à la centrale, mais ne couvre pas l'ensemble des opérations liées au SSI.

Après la mise en service, toute mise hors service exceptionnelle de tout ou partie du S.S.I. doit être signalée par écrit à l'exploitant qui devra prendre toutes les dispositions pour suppléer le manque de détection ou de mise en sécurité.

Si lors de la vérification de l'isolement par rapport à la terre, le résultat n'est pas correct, il est indispensable d'identifier ce défaut d'isolement sur la ligne et d'y remédier avant la mise sous tension.

Pour cela, procéder par élimination des tronçons de ligne.

## > UTILISATION DU DOCUMENT

Pour renseigner ce document, Mettre un « X » pour valider le résultat dans les colonnes :

« Bon »,

« Sans objet ».

Effectuer successivement chacun des contrôles identifiés dans la colonne contrôle.

Si nécessaire, renseigner la colonne « mesures et / ou remarques ».

# Contrôles hors tension et câbles non raccordés



Multimètre (Numéro de série : .....)  
Pince ampérométrique (Numéro de série : .....)  
Matériel pour essai de fonctionnement des détecteurs.



S'assurer que l'alimentation de la centrale est consignée (départ de l'organe de coupure condamnée, étiquette d'identification présente et vérification d'absence de tension effectuée).

## > CONTROLE VISUEL

| Contrôle                                                                                                                                             | Bon | Sans objet | Mesures et / ou remarques |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------------------------|
| État externe de la centrale                                                                                                                          |     |            |                           |
| Implantation dans un local protégé par de la détection automatique.                                                                                  |     |            |                           |
| Absence de rayure, de trace de choc.                                                                                                                 |     |            |                           |
| Solidité des fixations.                                                                                                                              |     |            |                           |
| Documentation                                                                                                                                        |     |            |                           |
| Présence du plan du risque, des consignes, livret des consignes et des procédures, d'une notice simplifiée d'utilisation à proximité de la centrale. |     |            |                           |
| Vérifier que le client dispose du manuel d'exploitation.                                                                                             |     |            |                           |
| État interne de la centrale                                                                                                                          |     |            |                           |
| Fixation des cartes électroniques.                                                                                                                   |     |            |                           |
| Raccordement et passage des câbles effectués correctement.                                                                                           |     |            |                           |
| Présence de l'estampille NF-SSI sur la centrale                                                                                                      |     |            |                           |
| Estampille NF-SSI visible au niveau d'accès 1.                                                                                                       |     |            |                           |



**Rappel : Aucune dérivation n'est autorisée sur ces lignes.**

Les lignes collectives peuvent être mises en œuvre sur les trois éléments suivants :

Carte UES générale



La carte UES générale est mise en œuvre dans un châssis gamme IN.

Carte UAC 16ZD CAN



La carte UAC 16ZD CAN est mise en œuvre dans un châssis gamme IN.

Module ICF I.Scan+



Le module ICF I.Scan+ est mis en œuvre sur le bus adressé I.Scan.

| Contrôle                                                                                                                                                                                                      | Bon | Sans<br>objet | Zone N° |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|
|                                                                                                                                                                                                               |     |               | 1       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Type de câble                                                                                                                                                                                                 |     |               |         |   |   |   |   |   |   |   |
| Une paire 8/10 <sup>e</sup> ( <i>minimum</i> ) avec écran (carte UES générale et UAC 16ZD CAN), sans écran (ICF I.Scan+).                                                                                     |     |               |         |   |   |   |   |   |   |   |
| Vérification de l'impédance de la ligne                                                                                                                                                                       |     |               |         |   |   |   |   |   |   |   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Carte UES générale et UAC 16ZD CAN &gt; 3,7 KΩ et &lt; 4,1 KΩ (typique : 3,9 KΩ).</li><li>• Module ICF+ : &gt; 42μF et &lt; 52 μF (<i>typique</i> : 47 μF).</li></ul> |     |               |         |   |   |   |   |   |   |   |
| Isolement des conducteurs par rapport à la terre                                                                                                                                                              |     |               |         |   |   |   |   |   |   |   |
| Impédance entre le + et la terre > 1 MΩ.                                                                                                                                                                      |     |               |         |   |   |   |   |   |   |   |
| Impédance entre le - et la terre > 1 MΩ.                                                                                                                                                                      |     |               |         |   |   |   |   |   |   |   |

| Contrôle                                                                                                                                                                                                      | Bon | Sans<br>objet | Zone N° |    |    |    |    |    |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------|----|----|----|----|----|----|----|
|                                                                                                                                                                                                               |     |               | 9       | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Type de câble                                                                                                                                                                                                 |     |               |         |    |    |    |    |    |    |    |
| Une paire 8/10 <sup>e</sup> ( <i>minimum</i> ) avec écran (carte UES générale et UAC 16ZD CAN), sans écran (ICF I.Scan+).                                                                                     |     |               |         |    |    |    |    |    |    |    |
| Vérification de l'impédance de la ligne                                                                                                                                                                       |     |               |         |    |    |    |    |    |    |    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Carte UES générale et UAC 16ZD CAN &gt; 3,7 KΩ et &lt; 4,1 KΩ (typique : 3,9 KΩ).</li><li>• Module ICF+ : &gt; 42μF et &lt; 52 μF (<i>typique</i> : 47 μF).</li></ul> |     |               |         |    |    |    |    |    |    |    |
| Isolement des conducteurs par rapport à la terre                                                                                                                                                              |     |               |         |    |    |    |    |    |    |    |
| Impédance entre le + et la terre > 1 MΩ.                                                                                                                                                                      |     |               |         |    |    |    |    |    |    |    |
| Impédance entre le - et la terre > 1 MΩ.                                                                                                                                                                      |     |               |         |    |    |    |    |    |    |    |

## > VERIFICATION DES LIGNES ADRESSEES I.SCAN

Les bus adressés I.Scan peuvent être mis en œuvre sur les deux éléments suivants :

Carte UAI 2B directe IN



La carte UAI 2B directe IN est mise en œuvre sur la carte UES générale.  
Les raccordements des bus adressés sont effectués sur cette carte UES générale.


Carte UAI 2B Lon IN



La carte UAI 2B Lon IN est mise en œuvre dans un châssis gamme IN.

| Contrôle                                                                                                    | Bon | Sans objet | Mesures et / ou remarques |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------------------------|
| Type de câble                                                                                               |     |            |                           |
| Une paire 8/10 <sup>e</sup> ( <i>minimum</i> ) sans écran.                                                  |     |            |                           |
| Vérification de l'impédance du bus I.Scan                                                                   |     |            |                           |
| Impédance entre le V(-) aller et V(-) retour < 56 Ω.                                                        |     |            |                           |
| Longueur maximum du bus < 1600 m (en 1 paire 8/10 <sup>e</sup> ).                                           |     |            |                           |
| Longueur maximum entre le départ et tout point sur une dérivation < 2000 m (en 1 paire 8/10 <sup>e</sup> ). |     |            |                           |
| Longueur maximum entre le retour et tout point sur une dérivation < 2000 m (en 1 paire 8/10 <sup>e</sup> ). |     |            |                           |
| Longueur maximum du bus et de ses dérivationes < 2000 m.                                                    |     |            |                           |
| Isolement des conducteurs par rapport à la terre                                                            |     |            |                           |
| Impédance entre le + et la terre > 1 MΩ.                                                                    |     |            |                           |
| Impédance entre le - et la terre > 1 MΩ.                                                                    |     |            |                           |

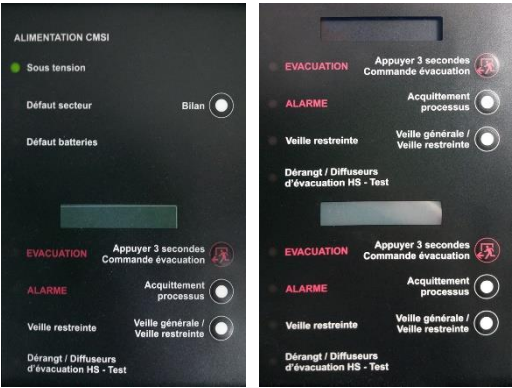

| Face avant                                                                                                                      | Les diffuseurs d'évacuation peuvent être mis en œuvre sur les éléments ci-dessous                                                                           |                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                 | Carte UES générale                                                                                                                                          | Carte 4/8 voies CAN                                                                                                                                               |
| <p>Carte US Alim / 1ZA – Carte CF 2ZA CAN</p>  |  <p>La carte UES générale est mise en œuvre dans un châssis gamme IN.</p> |  <p>Les cartes 4/8 voies CAN sont mises en œuvre dans un châssis gamme IN.</p> |



### ■ Lignes d'évacuation raccordées sur la carte UES générale

| Contrôle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bon | Sans objet | Mesures et / ou remarques |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |            | Sortie N° 1               | Sortie N° 2 |
| Type de câble                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |            |                           |             |
| Câble 2 x 1,5 mm² ( <i>minimum</i> ) sans écran / CR1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |            |                           |             |
| Vérification de l'impédance (jusqu'à 4 branches max. pour les 2 sorties UGA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |            |                           |             |
| Impédance de la ligne :<br><ul style="list-style-type: none"><li>• 1 fin de ligne : &gt; 9,50 KΩ et &lt; 10,50 KΩ (typique : 10,0 KΩ)</li><li>• 2 fins de ligne : &gt; 4,75 KΩ et &lt; 5,25 KΩ (typique : 1,9 KΩ).</li><li>• 3 fins de ligne : &gt; 3,16 KΩ et &lt; 3,47 KΩ (typique : 3,3 KΩ).</li><li>• 4 fins de ligne: &gt; 2,37 KΩ et &lt; 2,63 KΩ (typique : 2,5 KΩ).</li></ul> |     |            |                           |             |
| Isolement des conducteurs par rapport à la terre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |            |                           |             |
| Impédance entre le + et la terre > 1 MΩ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |            |                           |             |
| Impédance entre le - et la terre > 1 MΩ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |            |                           |             |

### ■ Lignes d'évacuation raccordées sur la carte 4/8 voies CAN

| Contrôle 1 <sup>ère</sup> carte                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VOIE N° | Bon | Sans objet | Mesures et / ou remarques |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |     |            | 1                         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Type de câble                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |     |            |                           |   |   |   |   |   |   |   |
| Câble 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> (minimum) sans écran. CR1.                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |     |            |                           |   |   |   |   |   |   |   |
| Nombre de fins de ligne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |     |            |                           |   |   |   |   |   |   |   |
| Vérification de l'impédance                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |     |            |                           |   |   |   |   |   |   |   |
| Impédance de la ligne :<br>• Avec 1 fin de ligne :<br>> 9,50 KΩ et < 10,50 KΩ (typique : 10,0 KΩ).<br>• Avec 2 fins de ligne :<br>> 4,75 KΩ et < 5,25 KΩ (typique : 5,0 KΩ).<br>• Avec 3 fins de ligne :<br>> 3,16 KΩ et < 3,50 KΩ (typique : 3,3 KΩ).<br>• Avec 4 fins de ligne:<br>> 2,37 KΩ et < 2,63 KΩ (typique : 2,5 KΩ). |         |     |            |                           |   |   |   |   |   |   |   |
| Isolement des conducteurs par rapport à la terre                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |     |            |                           |   |   |   |   |   |   |   |
| Impédance entre le CDL+ et la terre > 1 MΩ.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |     |            |                           |   |   |   |   |   |   |   |
| Impédance entre le CDL- et la terre > 1 MΩ.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |     |            |                           |   |   |   |   |   |   |   |

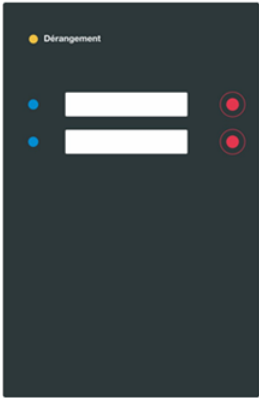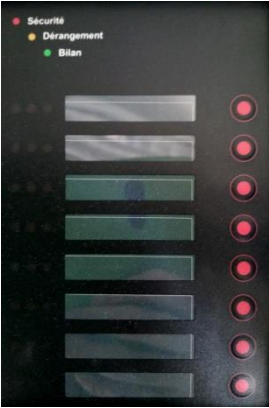

| Face avant                                                                                                                                                                                                   | Les DAS peuvent être mises en œuvre sur les éléments ci-dessous                                                                                           |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                              | Carte UES générale<br>(Fonctions 1 et 2)                                                                                                                  | Cartes 4 voies CAN<br>et 8 voies CAN<br>(Fonctions 1 à 8)                                                                                                        |
| <p>Carte 2F CAN</p>  <p>Carte 8F CAN</p>  |  <p>La carte UES générale est mise en œuvre dans un châssis gamme IN</p> |  <p>Les cartes 4/8 voies CAN sont mises en œuvre dans un châssis gamme IN</p> |

### ■ Carte 2F CAN : vérification des lignes de mise en sécurité sur la carte UES générale

| Contrôle                                                                                                       | Bon | Sans objet | Fonction N° |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------|---|
|                                                                                                                |     |            | 1           | 2 |
| <b>Masquage des fonctions</b>                                                                                  |     |            |             |   |
| Vérifier que les fonctions non utilisées sont munies d'un obturateur.                                          |     |            |             |   |
| <b>Ligne de télécommande</b>                                                                                   |     |            |             |   |
| <b>Type de câble</b>                                                                                           |     |            |             |   |
| Câble : 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> minimum sans écran / C2.                                                       |     |            |             |   |
| <b>Vérification de l'impédance</b>                                                                             |     |            |             |   |
| Effectuer un court-circuit en fin de ligne, et vérifier que l'impédance entre les deux conducteurs est < 15 Ω. |     |            |             |   |
| Retirer impérativement le court-circuit après le contrôle.                                                     |     |            |             |   |
| <b>Isolement des conducteurs par rapport à la terre</b>                                                        |     |            |             |   |
| Impédance entre le + et la terre > 1 MΩ.                                                                       |     |            |             |   |
| Impédance entre le - et la terre > 1 MΩ.                                                                       |     |            |             |   |
| <b>Nombre de DAS / DCT raccordés</b>                                                                           |     |            |             |   |
| Indiquer le nombre.                                                                                            |     |            |             |   |
| <b>Contrôle de la présence des diodes de roue libre</b>                                                        |     |            |             |   |
| Vérifier par échantillonnage la présence des diodes de roue libre sur les DAS à rupture (1 sur 10).            |     |            |             |   |

## ■ Carte 8F CAN : vérification des lignes de mise en sécurité sur une carte 4/8 voies CAN

| Contrôle 1 <sup>ère</sup> carte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Voie N° | Bon | Sans objet | Fonction N° |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |     |            | 1           | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Masquage des fonctions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |     |            |             |   |   |   |   |   |   |   |
| Vérifier que les fonctions non utilisées sont munies d'un obturateur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |     |            |             |   |   |   |   |   |   |   |
| Pour chacune des lignes de télécommande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |     |            |             |   |   |   |   |   |   |   |
| Type de câble                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |     |            |             |   |   |   |   |   |   |   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Câble 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> minimum sans écran.</li><li>• Commande à émission : CR1 ou C2 dans un cheminement technique protégé.</li><li>• Commande à rupture : C2.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                             |         |     |            |             |   |   |   |   |   |   |   |
| Vérification de l'impédance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |     |            |             |   |   |   |   |   |   |   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Commande à émission, impédance de la ligne : &gt; 9,5 K Ω et &lt; 10,5 K Ω (<i>typique : 10,0 KΩ</i>).<br/><b>Rappel</b> : Aucune dérivation n'est autorisée sur ces lignes.</li><li>• Commande à rupture :<br/>Effectuer un court-circuit en fin de ligne, et vérifier que l'impédance entre les deux conducteurs est &lt; 15 Ω.<br/>Retirer impérativement le court-circuit après le contrôle.</li></ul> |         |     |            |             |   |   |   |   |   |   |   |
| Isolement des conducteurs par rapport à la terre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |     |            |             |   |   |   |   |   |   |   |
| Impédance entre le + et la terre > 1 MΩ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |     |            |             |   |   |   |   |   |   |   |
| Impédance entre le - et la terre > 1 MΩ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |     |            |             |   |   |   |   |   |   |   |
| Nombre de DAS / DCT raccordés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |     |            |             |   |   |   |   |   |   |   |
| Indiquer le nombre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |     |            |             |   |   |   |   |   |   |   |
| Contrôle de la présence des diodes de roue libre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |     |            |             |   |   |   |   |   |   |   |
| Vérifier par échantillonnage la présence des diodes de roue libre sur les DAS à rupture.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |     |            |             |   |   |   |   |   |   |   |
| Pour chacune des lignes de contrôle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |     |            |             |   |   |   |   |   |   |   |
| Type de câble                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |     |            |             |   |   |   |   |   |   |   |
| Une ou deux paires 8/10 <sup>e</sup> ( <i>minimum</i> ) avec ou sans écran.<br>CR1 ou C2 dans un cheminement technique protégé.<br>Câbles séparés pour le début de course et le fin de course.                                                                                                                                                                                                                                                     |         |     |            |             |   |   |   |   |   |   |   |
| Vérification de l'impédance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |     |            |             |   |   |   |   |   |   |   |
| Impédance de la ligne début de course : > 1,71 K Ω et < 1,89 K Ω ( <i>typique : 1,8 KΩ</i> ).<br><b>Rappel</b> : Aucune dérivation n'est autorisée sur ces lignes.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |     |            |             |   |   |   |   |   |   |   |
| Impédance de la ligne fin de course : > 1,71 K Ω et < 1,89 K Ω ( <i>typique : 1,8 KΩ</i> ).<br><b>Rappel</b> : Aucune dérivation n'est autorisée sur ces lignes.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |     |            |             |   |   |   |   |   |   |   |
| Isolement des conducteurs par rapport à la terre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |     |            |             |   |   |   |   |   |   |   |
| Impédance entre la ligne PA et la terre > 1 MΩ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |     |            |             |   |   |   |   |   |   |   |
| Impédance entre la ligne PS et la terre > 1 MΩ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |     |            |             |   |   |   |   |   |   |   |
| Impédance entre le commun et la terre > 1 MΩ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |     |            |             |   |   |   |   |   |   |   |

## > VERIFICATION DU BUS LON INTERNE

| Contrôle                                                                                                                                      | Bon | Sans objet | Mesures et / ou remarques |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------------------------|
| <b>Câblage du bus Lon interne</b>                                                                                                             |     |            |                           |
| Vérifier que le câblage du bus Lon interne est bien en topologie « libre » ou « free ».<br>Vérifier la répartition des résistances de charge. |     |            |                           |
| <b>Cavalier sur cartes 1, 2 ou 4 voies Lon FTT</b>                                                                                            |     |            |                           |
| Vérifier la position des cavaliers.                                                                                                           |     |            |                           |

## > VERIFICATION DU CAN INTERNE

| Contrôle                            | Bon | Sans objet | Mesures et / ou remarques |
|-------------------------------------|-----|------------|---------------------------|
| <b>Cavalier sur cartes CAN</b>      |     |            |                           |
| Vérifier la position des cavaliers. |     |            |                           |

## > VERIFICATION DU BUS « RS » DES REPETITEURS IN.REP+

| Contrôle                                                          | Bon | Sans objet | Mesures et / ou remarques |
|-------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------------------------|
| <b>Type de câble pour alimentation et communication répéteurs</b> |     |            |                           |
| Deux câbles une paire 8/10e minimum avec écran.                   |     |            |                           |

### Ligne alimentation répéteurs

#### Vérification de l'impédance

Effectuer un court-circuit (*conducteur + et conducteur -*) au niveau du dernier répéteur et vérifier que l'impédance entre les deux conducteurs est  $< 30 \Omega$ .  
Retirer impérativement le court-circuit après le contrôle.

#### Isolement des conducteurs par rapport à la terre.

Impédance entre le + et la terre  $> 1 M\Omega$ .

Impédance entre le - et la terre  $> 1 M\Omega$ .

### Ligne communication répéteurs

#### Vérification de l'impédance

Effectuer un court-circuit (*conducteur + et conducteur -*) au niveau du dernier répéteur et vérifier que l'impédance entre les deux conducteurs est  $< 30 \Omega$ .  
Retirer impérativement le court-circuit après le contrôle.

#### Isolement des conducteurs par rapport à la terre

Impédance entre le + et la terre  $> 1 M\Omega$ .

Impédance entre le - et la terre  $> 1 M\Omega$ .

Vérifier la présence de la carte TERMINAISON RS.Rep

> VERIFICATION DES REPETITEURS LON


| Contrôle                                                                                                                                                                                             | Bon | Sans objet | Mesures et / ou remarques |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------------------------|
| Ligne alimentation répéteurs                                                                                                                                                                         |     |            |                           |
| Type de câble                                                                                                                                                                                        |     |            |                           |
| Câble 2x1,5mm <sup>2</sup> ( <i>minimum</i> ) sans écran.                                                                                                                                            |     |            |                           |
| Isolement des conducteurs par rapport à la terre                                                                                                                                                     |     |            |                           |
| Impédance entre le + et la terre > 1 MΩ.                                                                                                                                                             |     |            |                           |
| Impédance entre le - et la terre > 1 MΩ.                                                                                                                                                             |     |            |                           |
| Tension d'alimentation                                                                                                                                                                               |     |            |                           |
| Vérifier que la tension mesurée est comprise entre 18 et 50V.                                                                                                                                        |     |            |                           |
| Ligne communication répéteurs                                                                                                                                                                        |     |            |                           |
| Type de câble                                                                                                                                                                                        |     |            |                           |
| Une paire 8/10 <sup>e</sup> ( <i>minimum</i> ) avec écran.                                                                                                                                           |     |            |                           |
| Vérification de la charge Lon                                                                                                                                                                        |     |            |                           |
| Vérifier que la charge Lon est en position « bus » au départ de la ligne, et vérifier que la résistance de 105 Ω est bien présente dans le dernier répéteur LON.Rep (ou SW11 sur T pour INnova-TRE). |     |            |                           |
| Isolement des conducteurs par rapport à la terre                                                                                                                                                     |     |            |                           |
| Impédance entre le + et la terre > 1 MΩ.                                                                                                                                                             |     |            |                           |
| Impédance entre le - et la terre > 1 MΩ.                                                                                                                                                             |     |            |                           |
| Vérifier la présence du cavalier S3 sur Normal (repère S3 – BUZZER sur la carte du LON.Rep)                                                                                                          |     |            |                           |
| Vérifier pour chaque LON.Rep, la présence du cavalier S3 sur « Normal » (lors d'une perte totale d'alimentation, un signal sonore pulsé est émis pendant 1 heure).                                   |     |            |                           |
| Vérifier la position du curseur SW2 sur Activé (repère SW2 sur la carte de l'INnova-TRE)                                                                                                             |     |            |                           |
| Vérifier pour chaque INnova-TRE, la position de SW2 sur « Activé » (lors d'une perte totale d'alimentation, un signal sonore pulsé est émis pendant 1 heure).                                        |     |            |                           |

Contrôles sous tension et câbles raccordés

Toute mesure effectuée sur le domaine de tension hors TBT doit se faire équipé(e) de l'écran facial, du casque et des gants isolants.

L'ensemble des contrôles hors ceux liés à l'alimentation doivent être effectués sur batterie.

Contrôle du raccordement secteur

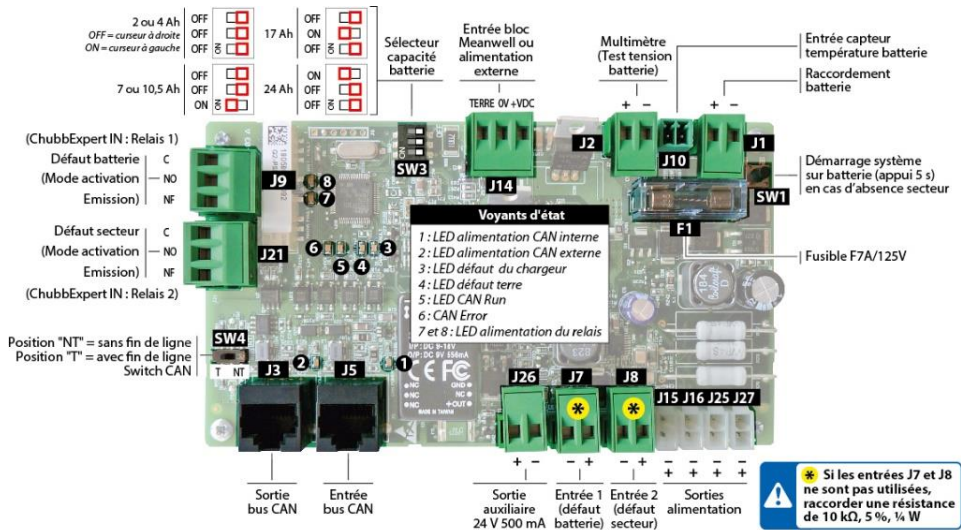

| Contrôle                                                                                                                                     | Bon | Sans objet | Mesures et / ou remarques |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------------------------|
| <b>Raccordement au secteur</b>                                                                                                               |     |            |                           |
| Vérifier que l'alimentation est réalisée au moyen d'une dérivation issue directement du tableau principal du bâtiment ou de l'établissement. |     |            |                           |
| Vérifier que des moyens de protection sont en place sur cette dérivation. *                                                                  |     |            |                           |
| Vérifier que cette dérivation est étiquetée. *                                                                                               |     |            |                           |
| Vérifier la présence du collier anti-arrachement et du collier de maintien des 3 conducteurs du câble secteur.                               |     |            |                           |

## Contrôles généraux

### Protection

Vérifier que les fusibles secteurs sont retirés.  
Vérifier que les batteries ne sont pas raccordées.

### Contrôle de la tension secteur

Indiquer le régime de NEUTRE (*TT, TN, IT*).

- TT = Neutre relié à la terre + Masse reliée à la terre.
- TN = Neutre relié à la terre + Masse reliée au Neutre.
- IT = Neutre relié à la terre à travers une impédance + Masse reliée à la terre (\*).


(\*) *Vérifier la présence au niveau du TGBT d'un Auxiliaire à seuil de surtension (et uniquement pour le schéma IT sans distribution du neutre, d'un transformateur d'isolement) obligatoire en régime IT.*

Mesurer la tension secteur et indiquer la valeur :  
(elle doit être comprise entre) 198 Volts~ < U < 253 Volts~.

### Contrôle terre

RÉSEAU DE TERRE CONFORME à la NF C 15-100 \*.

\* Demander une attestation auprès du personnel qualifié.

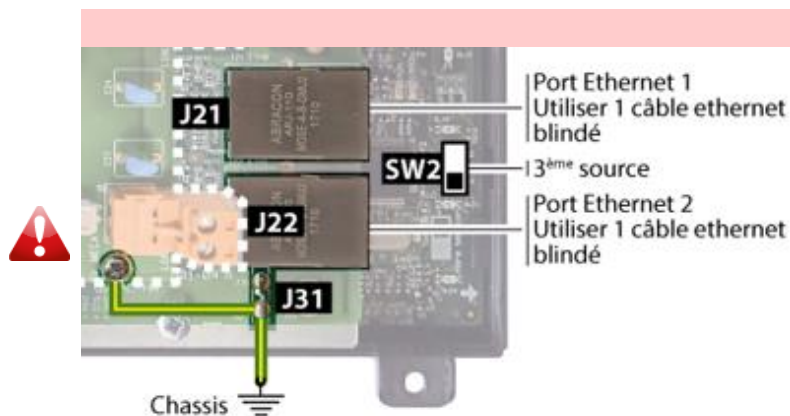

**Avant la mise sous tension de la centrale, placer le contact SW2 (3<sup>ème</sup> source) de la carte IHM afficheur sur ON (position en bas)**

## Mise sous tension

Mettre l'alimentation secteur hors tension.

Mettre les fusibles secteurs en place.

Remettre ensuite l'alimentation secteur sous tension.

Attendre l'apparition du défaut batterie.

## ■ Alimentation interne ECS

| Batteries associables    | 4, 7, 10.5, 17 et 24 Ah        |                           |                                      |                 |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------|
|                          | Capacité nominale (C/10 à 20h) | YUCEL YUASA               | POWER SONIC                          | POWER SONIC     |
| Références batteries 12V | 4                              | Y 4-12 FR<br>NP 4-12 FR   | PS-1242 V0<br>(marquage PS-1242 B)   | PS-1242 FR      |
|                          | 7                              | Y 7-12 FR<br>NP 7-12 FR   | PS-1270 V0<br>(marquage PS-1270 B)   | PS-1270 FR VdS  |
|                          | 10.5                           | -                         | -                                    | PS-12100H FR    |
|                          | 17                             | Y 17-12IFR<br>NP 17-12IFR | PS-12180 V0<br>(marquage PS-12180 B) | PS-12180 FR     |
|                          | 24                             | Y 24-12IFR<br>NP 24-12IFR | PS-12260 V0<br>(marquage PS-12260 B) | PS-12260 FR VdS |

| Contrôle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bon | Sans objet | Mesures et /ou remarques |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------------------|
| <b>Examen visuel des batteries</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |            |                          |
| Contrôler visuellement l'aspect des batteries (sulfatation...).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |            |                          |
| Vérifier le serrage des connexions.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |            |                          |
| Contrôler les fusibles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |            |                          |
| Noter la date de mise en place de la batterie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |            |                          |
| <b>Vérification de la tension de charge des batteries</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |            |                          |
| Vérifier la tension de charge batteries, les batteries étant connectée au chargeur.<br>La mesure se fait directement sur les cosses des batteries.<br>Vérifier que la tension progresse lentement ou qu'elle se maintient à la tension suivante :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 28,0V +/- 0,3 à 10°C</li> <li>• 27,6V +/- 0,3 à 15°C</li> <li>• 27,2V +/- 0,3 à 20°C</li> <li>• 27,0V +/- 0,3 à 25°C</li> <li>• 26,8V +/- 0,3 à 30°C</li> </ul> |     |            |                          |
| <b>Vérification de la tension batterie hors charge</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |            |                          |
| Vérifier la tension des batteries à vide, sans liaison au chargeur.<br>La mesure se fait directement sur les cosses de la batterie.<br>Cette tension doit être comprise entre 23V et 28V.                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |            |                          |
| <b>Vérification du courant de batteries</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |            |                          |
| Mesurer le courant fourni par les batteries (secteur absent) et s'assurer que la valeur mesurée est conforme aux caractéristiques fournies sur les fiches catalogue des alimentations.                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |            |                          |
| <b>Vérification de la tension batteries après une heure de décharge</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |            |                          |
| Mesurer la tension batteries au début de décharge. Elle doit être comprise entre 25V et 28V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |            |                          |
| Mesurer la tension batteries après une heure de décharge la centrale étant en veille.<br>Elle doit être comprise entre 25V et 28V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |            |                          |
| <b>Contrôle de la capacité batteries</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |            |                          |
| Vérifier que la capacité des batteries correspond bien à ce qui a été déterminé par calcul.<br>Vérifier que le positionnement des cavaliers correspond au choix des batteries.                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |            |                          |
| Mettre la centrale au niveau d'accès 3 pour supprimer la temporisation avant la signalisation des défauts d'alimentation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |            |                          |
| <b>Signalisation défaut batteries ECS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |            |                          |
| Retirer la cosse + d'une batterie ECS sur la centrale, contrôler que le voyant "défaut batterie" s'allume et qu'il n'y a aucune commande des organes externes ni perte d'information.<br>Après remise de la cosse de la batterie, la signalisation de défaut batteries doit s'effacer automatiquement.                                                                                                                                                        |     |            |                          |



| Contrôle                                                                                                                                                                                                                                                            | Bon | Sans objet | Mesures et / ou remarques |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------------------------|
| <b>Signalisation défaut secteur</b>                                                                                                                                                                                                                                 |     |            |                           |
| Couper le secteur, contrôler que le voyant "défaut secteur" s'allume et qu'il n'y a aucune commande des organes externes ni perte d'information.<br>Après remise du secteur, la signalisation de défaut doit s'effacer automatiquement.                             |     |            |                           |
| <b>Les essais sont à faire en absence du secteur en intercalant un ampèremètre (ou en plaçant une pince ampérométrique autour du conducteur relié à la cosse +) entre la cosse + de la batterie et le conducteur normalement relié à la cosse + de la batterie.</b> |     |            |                           |
| <b>Consommation du tableau en Veille</b>                                                                                                                                                                                                                            |     |            |                           |
| Mesurer le courant au niveau des batteries dédiées à la détection.                                                                                                                                                                                                  |     |            |                           |
| <b>Consommation du tableau en Alarme</b>                                                                                                                                                                                                                            |     |            |                           |
| Mesurer le courant au niveau des batteries dédiées à la détection.                                                                                                                                                                                                  |     |            |                           |

## ■ Alimentation interne CMSI

### Alimentation 150W IN :

| Batteries associables           | 4, 7, 10,5, 17 et 24 Ah           |                          |                                    |                 |
|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------|
|                                 | Capacité nominale<br>(C/10 à 20h) | YUCEL / YUASA            | POWER SONIC                        | POWER SONIC     |
| <b>Références batteries 12V</b> | 4                                 | Y 4-12 FR / NP 4-12 FR   | PS-1242 V0<br>marquage PS-1242 B   | PS-1242 FR      |
|                                 | 7                                 | Y 7-12 FR / NP 7-12 FR   | PS-1270 V0<br>marquage PS-1270 B   | PS-1270 FR Vds  |
|                                 | 10,5                              | -                        | -                                  | PS-12100H FR    |
|                                 | 17                                | Y 17-12IFR / NP 17-12IFR | PS-12180 V0<br>marquage PS-12180 B | PS-12180 FR     |
|                                 | 24                                | Y 24-12IFR / NP 24-12IFR | PS-12260 V0<br>marquage PS-12260 B | PS-12260 FR Vds |

### Alimentation VARIATION

| Batteries associables           | 7, 17, 24, 38 et 65 Ah            |                          |                                    |                 |
|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------|
|                                 | Capacité nominale<br>(C/10 à 20h) | YUCEL / YUASA            | POWER SONIC                        | POWER SONIC     |
| <b>Références batteries 12V</b> | 7                                 | Y 7-12 FR / NP 7-12 FR   | PS-1270 V0<br>marquage PS-1270 B   | PS-1270 FR Vds  |
|                                 | 17                                | Y 17-12IFR / NP 17-12IFR | PS-12180 V0<br>marquage PS-12180 B | PS-12180 FR     |
|                                 | 24                                | Y 24-12IFR / NP 24-12IFR | PS-12260 V0<br>marquage PS-12260 B | PS-12260 FR Vds |
|                                 | 38                                | Y 38-12IFR / NP 38-12IFR | PS-12400 V0<br>marquage PS-12400 B | PS-12400 FR     |
|                                 | 65                                | Y 65-12IFR / NP 65-12IFR | PS-12700 V0<br>marquage PS-12700 B | PS-12650 FR Vds |

| Contrôle                                                        | Bon | Sans objet | Mesures et / ou remarques |
|-----------------------------------------------------------------|-----|------------|---------------------------|
| <b>Examen visuel des batteries</b>                              |     |            |                           |
| Contrôler visuellement l'aspect des batteries (sulfatation...). |     |            |                           |
| Vérifier le serrage des connexions.                             |     |            |                           |
| Contrôler les fusibles.                                         |     |            |                           |
| Noter la date de mise en place de la batterie.                  |     |            |                           |

| Vérification de la tension de charge de la batterie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Vérifier la tension de charge batterie, la batterie étant connectée au chargeur.<br>La mesure se fait directement sur les cosses de la batterie.<br>Vérifier que la tension progresse lentement ou qu'elle se maintient à la tension suivante :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 28,0V +/- 0,3 à 10°C</li> <li>• 27,6V +/- 0,3 à 15°C</li> <li>• 27,2V +/- 0,3 à 20°C</li> <li>• 27,0V +/- 0,3 à 25°C</li> <li>• 26,8V +/- 0,3 à 30°C</li> </ul> |  |  |  |
| Vérification de la tension batterie hors charge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| Vérifier la tension des batteries à vide, sans liaison au chargeur.<br>La mesure se fait directement sur les cosses de la batterie.<br>Cette tension doit être comprise entre 23V et 28V.                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| Vérification du courant de batterie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| Mesurer le courant fourni par les batteries (secteur absent) et s'assurer que la valeur mesurée est conforme aux caractéristiques fournies sur les fiches catalogue des alimentations.                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| Vérification de la tension batterie après une heure de décharge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| Mesurer la tension batterie au début de décharge. Elle doit être comprise entre 25V et 28V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| Mesurer la tension batterie après une heure de décharge la centrale étant en veille. Elle doit être comprise entre 25V et 28V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| Contrôle de la capacité batterie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| Vérifier que la capacité des batteries correspond bien à ce qui a été déterminé par calcul.<br>Vérifier que le positionnement des cavaliers correspond au choix des batteries.                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| Mettre la centrale au niveau d'accès 3 pour supprimer la temporisation avant la signalisation des défauts d'alimentation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| Signalisation défaut batteries CMSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| Retirer la cosse + d'une batterie CMSI sur la centrale, contrôler que le voyant "défaut batterie" s'allume et qu'il n'y a aucune commande des organes externes ni perte d'information.<br>Après remise de la cosse de la batterie, la signalisation de défaut batteries doit s'effacer automatiquement.                                                                                                                                                     |  |  |  |
| Signalisation défaut secteur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| Couper le secteur, contrôler que le voyant "défaut secteur" s'allume et qu'il n'y a aucune commande des organes externes ni perte d'information.<br>Après remise du secteur, la signalisation de défaut doit s'effacer automatiquement.                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| Consommation de la centrale en Veille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| Mesurer le courant au niveau des batteries dédiées à la mise en sécurité.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| Consommation de la centrale en Alarme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| Mesurer le courant au niveau des batteries dédiées à la mise en sécurité.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |

**Nota :**

*Dans le cas d'une alimentation externe, les mêmes types de contrôles seront effectués sur cette alimentation, et les mêmes recommandations s'appliquent.*

|                                                                |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Contrôler que les check-lists des alimentations sont remplies. |  |  |  |
| Indiquer le nombre d'alimentations.                            |  |  |  |

## > VERIFICATION DE LA PROGRAMMATION



Garder une trace de la configuration chantier.

| Contrôle                                                                                                                             | Bon | Sans objet | Mesures et / ou remarques |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------------------------|
| <b>Vérification de la configuration</b>                                                                                              |     |            |                           |
| S'assurer que l'édition de la programmation est relue et signée par le chargé d'affaires ou responsable réalisation pour validation. |     |            |                           |

## > VERIFICATION DES LIGNES COLLECTIVES

| Contrôle                                                                                                                                                                       | Bon | Sans<br>objet | Zone N° |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|
|                                                                                                                                                                                |     |               | 1       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Vérification des lignes collectives                                                                                                                                            |     |               |         |   |   |   |   |   |   |   |
| Retirer le dernier détecteur de la ligne et vérifier que le défaut est bien signalé par le voyant dérangement général et par un message sur l'afficheur.                       |     |               |         |   |   |   |   |   |   |   |
| Remettre le détecteur.                                                                                                                                                         |     |               |         |   |   |   |   |   |   |   |
| Effectuer un feu sur ce détecteur et vérifier que le feu est bien signalé par la centrale par le voyant feu général et par un message sur l'afficheur.<br>Réarmer la centrale. |     |               |         |   |   |   |   |   |   |   |
| Contrôler l'étiquetage des détecteurs par rapport à la programmation des zones.                                                                                                |     |               |         |   |   |   |   |   |   |   |

| Contrôle                                                                                                                                                                       | Bon | Sans<br>objet | Zone N° |    |    |    |    |    |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------|----|----|----|----|----|----|----|
|                                                                                                                                                                                |     |               | 9       | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Vérification des lignes collectives                                                                                                                                            |     |               |         |    |    |    |    |    |    |    |
| Retirer le dernier détecteur de la ligne et vérifier que le défaut est bien signalé par le voyant dérangement général et par un message sur l'afficheur.                       |     |               |         |    |    |    |    |    |    |    |
| Remettre le détecteur.                                                                                                                                                         |     |               |         |    |    |    |    |    |    |    |
| Effectuer un feu sur ce détecteur et vérifier que le feu est bien signalé par la centrale par le voyant feu général et par un message sur l'afficheur.<br>Réarmer la centrale. |     |               |         |    |    |    |    |    |    |    |
| Contrôler l'étiquetage des détecteurs par rapport à la programmation des zones.                                                                                                |     |               |         |    |    |    |    |    |    |    |

| Contrôle                                                                                                                                                                       | Bon | Sans<br>objet | Zone N° |    |    |    |    |    |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------|----|----|----|----|----|----|----|
|                                                                                                                                                                                |     |               | 17      | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Vérification des lignes collectives                                                                                                                                            |     |               |         |    |    |    |    |    |    |    |
| Retirer le dernier détecteur de la ligne et vérifier que le défaut est bien signalé par le voyant dérangement général et par un message sur l'afficheur.                       |     |               |         |    |    |    |    |    |    |    |
| Remettre le détecteur.                                                                                                                                                         |     |               |         |    |    |    |    |    |    |    |
| Effectuer un feu sur ce détecteur et vérifier que le feu est bien signalé par la centrale par le voyant feu général et par un message sur l'afficheur.<br>Réarmer la centrale. |     |               |         |    |    |    |    |    |    |    |
| Contrôler l'étiquetage des détecteurs par rapport à la programmation des zones.                                                                                                |     |               |         |    |    |    |    |    |    |    |

## > VERIFICATION DES LIGNES ADRESSEES I.SCAN

| Contrôle                                                                                                                                                                                                                                 | Bon | Sans objet | Mesures et / ou remarques |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------------------------|
| <b>Vérification du bus</b>                                                                                                                                                                                                               |     |            |                           |
| Après raccordement du bus adressé, vérifier l'absence de défauts liés au bus adressé<br>(le contrôle est effectué par la centrale elle-même).                                                                                            |     |            |                           |
| Effectuer un court-circuit du bus adressé et vérifier que ce défaut est signalé visuellement sur la centrale par le voyant général dérangement et par un message sur l'afficheur.<br>Supprimer le court-circuit.<br>Réarmer la centrale. |     |            |                           |
| Effectuer le retrait d'un détecteur et vérifier que ce défaut est signalé visuellement sur la centrale par le voyant général dérangement et par un message sur l'afficheur.<br>Remettre le détecteur.<br>Réarmer la centrale.            |     |            |                           |
| Effectuer un feu et vérifier que le feu est signalé visuellement sur la centrale par le voyant général feu et par un message sur l'afficheur.<br>Réarmer la centrale.                                                                    |     |            |                           |
| <b>Contrôle de l'étiquetage</b>                                                                                                                                                                                                          |     |            |                           |
| Contrôler l'étiquetage des détecteurs par rapport à la programmation.                                                                                                                                                                    |     |            |                           |

## > VERIFICATION DE L'EVACUATION

| Contrôle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bon | Sans objet | Mesures et / ou remarques |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------------------------|
| <b>Vérifier la temporisation de l'alarme restreinte, et de diffusion de l'évacuation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |            |                           |
| Après raccordement des lignes de diffuseurs d'évacuation et réarmement de la centrale, le défaut "diffuseurs d'évacuation" doit disparaître.<br>Si le défaut persiste, vérifier la présence de la résistance de fin de ligne, le raccordement des diffuseurs d'évacuation...                                                                                                                                                                                |     |            |                           |
| Procéder à un déclenchement de l'évacuation en mode automatique, contrôler la temporisation de l'alarme restreinte (rappel : $t_{\text{mini}} = 0$ , $t_{\text{maxi}} = 5$ minutes) et la durée de diffusion de l'alarme d'évacuation (rappel : $t_{\text{mini}} = 5$ minutes).<br><i>Nota : Lorsque la diffusion de l'alarme d'évacuation est temporisée, vérifier que l'accord éventuel a été donné par la commission de sécurité ou le prescripteur.</i> |     |            |                           |
| Noter : <ul style="list-style-type: none"> <li>La valeur de la temporisation de l'alarme restreinte programmée avant le déclenchement du processus d'évacuation.</li> <li>La durée de commande d'évacuation.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                     |     |            |                           |
| <b>Vérifier le passage en dérangement de la centrale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |            |                           |
| Sur chaque ligne d'évacuation, débrancher le dernier diffuseur d'évacuation et s'assurer que la centrale détecte un dérangement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |            |                           |
| Après le test, rebrancher le dernier diffuseur d'évacuation et réarmer la centrale, le défaut "diffuseurs d'évacuation" doit disparaître.<br>Si le défaut persiste, vérifier la présence de la résistance de fin de ligne, le raccordement des diffuseurs d'évacuation.                                                                                                                                                                                     |     |            |                           |



**Le signal sonore d'évacuation doit être audible en tout point du bâtiment.**

## > VERIFICATION DE LA MISE EN SECURITE CARTE 2F CAN (CARTE UES GENERALE)

| Contrôle                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bon | Sans objet | Fonction N° |   | Remarques |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------|---|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |            | 1           | 2 |           |
| Effectuer une commande automatique de la fonction, contrôler la temporisation avant la commande des DAS.                                                                                                                                                                     |     |            |             |   |           |
| Noter la temporisation avant la commande des DAS.<br><i>Nota : Le déclenchement des DAS doit s'effectuer sans temporisation. Dans le cas contraire, vérifier que l'accord sur une temporisation éventuelle a été donné par la commission de sécurité ou le prescripteur.</i> |     |            |             |   |           |
| Passer la centrale au niveau 2 et effectuer un réarmement.                                                                                                                                                                                                                   |     |            |             |   |           |

## > CONTROLE DE LA MISE EN SECURITE CARTE 8F CAN (CARTE 4/8 VOIES CAN)

| Contrôle                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bon | Sans objet | Fonction N° |   |   |   |   |   |   |   | Remarques |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |            | 1           | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |           |
| Effectuer une commande automatique de la fonction, contrôler la temporisation avant la commande des DAS.                                                                                                                                                                     |     |            |             |   |   |   |   |   |   |   |           |
| Noter la temporisation avant la commande des DAS.<br><i>Nota : Le déclenchement des DAS doit s'effectuer sans temporisation. Dans le cas contraire, vérifier que l'accord sur une temporisation éventuelle a été donné par la commission de sécurité ou le prescripteur.</i> |     |            |             |   |   |   |   |   |   |   |           |
| Préciser le mode de commande (rupture, émission, impulsionnel).                                                                                                                                                                                                              |     |            |             |   |   |   |   |   |   |   |           |
| Passer la centrale au niveau 2 et effectuer un réarmement.                                                                                                                                                                                                                   |     |            |             |   |   |   |   |   |   |   |           |

## > VERIFICATION DES SORTIES RELAIS

| Contrôle                                                                                                                    | Bon | Sans objet | Mesures et / ou remarques |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------------------------|
| <b>Relais feu général</b>                                                                                                   |     |            |                           |
| Vérifier que le contact est fermé entre les bornes C et R en absence de feu.                                                |     |            |                           |
| <b>Relais dérangement général</b>                                                                                           |     |            |                           |
| Vérifier que le contact est fermé entre les bornes C et T en absence de dérangement.                                        |     |            |                           |
| <b>Relais des cartes UCR 12 / 24 relais CAN (contrôles à faire sur chacun des relais)</b>                                   |     |            |                           |
| Vérifier que les switches des relais assurant la commande d'une centrale extinction ne sont pas en sécurité positive.       |     |            |                           |
| Relais configuré comme non activé en veille.<br>Vérifier que le relais est activé en présence de sa condition d'activation. |     |            |                           |
| Relais configuré comme activé en veille.<br>Vérifier que le relais est désactivé en présence de sa condition d'activation.  |     |            |                           |

## > VERIFICATION DES REPETITEURS IN.REP+

| Contrôle                                                                                                                                                                                                                                         | Bon | Sans objet | Mesures et / ou remarques |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------------------------|
| <b>Vérification de la transmission des informations</b>                                                                                                                                                                                          |     |            |                           |
| Vérifier la transmission d'une alarme feu sur les répéteurs.                                                                                                                                                                                     |     |            |                           |
| Vérifier la transmission d'un dérangement sur les répéteurs.                                                                                                                                                                                     |     |            |                           |
| Vérifier que les répéteurs sont en veille après le réarmement de la centrale.                                                                                                                                                                    |     |            |                           |
| <b>Vérifier le passage en dérangement de la centrale</b>                                                                                                                                                                                         |     |            |                           |
| Débrancher le dernier répéteur de la ligne et s'assurer que la centrale passe en dérangement. Rebrancher le dernier répéteur après le test.                                                                                                      |     |            |                           |
| Vérifier le réarmement au niveau de la centrale.                                                                                                                                                                                                 |     |            |                           |
| <b>Vérification de la perte totale d'alimentation</b>                                                                                                                                                                                            |     |            |                           |
| Débrancher l'alimentation du dernier répéteur de la ligne et s'assurer que la centrale passe en dérangement. Contrôler également que l'indicateur de défaut ainsi que le buzzer du répéteur s'activent. Rebrancher l'alimentation après le test. |     |            |                           |
| Vérifier le réarmement au niveau de la centrale.                                                                                                                                                                                                 |     |            |                           |

## > VERIFICATION DES REPETITEURS LON


| Contrôle                                                                                                                                                                                                                                         | Bon | Sans objet | Mesures et / ou remarques |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------------------------|
| <b>Vérification de la transmission des informations</b>                                                                                                                                                                                          |     |            |                           |
| Vérifier la transmission d'une alarme feu sur les répéteurs.                                                                                                                                                                                     |     |            |                           |
| Vérifier la transmission d'un dérangement sur les répéteurs.                                                                                                                                                                                     |     |            |                           |
| Vérifier que les répéteurs sont en veille après le réarmement de la centrale.                                                                                                                                                                    |     |            |                           |
| <b>Vérifier le passage en dérangement de la centrale</b>                                                                                                                                                                                         |     |            |                           |
| Débrancher le dernier répéteur de la ligne et s'assurer que la centrale passe en dérangement. Rebrancher le dernier répéteur après le test.                                                                                                      |     |            |                           |
| Vérifier le réarmement au niveau de la centrale.                                                                                                                                                                                                 |     |            |                           |
| <b>Vérification de la perte totale d'alimentation</b>                                                                                                                                                                                            |     |            |                           |
| Débrancher l'alimentation du dernier répéteur de la ligne et s'assurer que la centrale passe en dérangement. Contrôler également que l'indicateur de défaut ainsi que le buzzer du répéteur s'activent. Rebrancher l'alimentation après le test. |     |            |                           |
| Vérifier le réarmement au niveau de la centrale.                                                                                                                                                                                                 |     |            |                           |



# Annexe – Méthodologie de prise de mesures Courant et Tension sur alimentation et batterie

## > VERIFICATION DE LA TENSION BATTERIES HORS CHARGE

- Déconnectez le fil « 1 » côté batterie.
- Multimètre sur calibre Voltmètre.
- Connectez le multimètre sur les cosses batterie aux points « A » et « B ».
- Effectuez la mesure et indiquez-la dans la Check List de vérification.
- Faites de même pour la deuxième batterie.



## > VERIFICATION DU COURANT AVEC UN AMPEREMETRE

- Déconnectez le fil « 1 » côté batterie.
- Multimètre sur calibre Ampèremètre.
- Connectez le multimètre sur les cosses aux points « A » et « B ».
- Coupez le secteur en « C ».




**Une fois le secteur retiré, la liaison multimètre / batterie ne doit pas être interrompue.**

### Mesure avant délestage ou sans délestage :

- Effectuez une première mesure et indiquez-la dans la Check List de vérification.

### Mesure après délestage :

- Effectuez une seconde mesure et indiquez-la dans la Check List de vérification.
- Remettez le secteur en « C ».
- Enlevez le multimètre et rebranchez le fil « 1 ».



## > VERIFICATION DU COURANT AVEC UNE PINCE AMPEROMETRIQUE


- Placez la pince en « A ».
- Coupez le secteur en « C ».

### Mesure avant délestage ou sans délestage :

- Effectuez une première mesure et indiquez-la dans la Check List de vérification.


### Mesure après délestage :

- Effectuez une seconde mesure et indiquez-la dans la Check List de vérification.
- Remettez le secteur en « C ».



## > VERIFICATION DE LA TENSION DE CHARGE BATTERIES

- Multimètre sur calibre Voltmètre et le fil « 1 » connecté
- Connectez le multimètre sur les cosses batterie aux points « A » et « B ».
- Effectuez la mesure et indiquez-la dans la Check List de vérification.
- Faites de même pour la deuxième batterie.



### Procéder systématiquement aux vérifications suivantes pour le calcul de l'autonomie des batteries :

**SDI** : (Courant mesuré en veille en A x 12 + Courant mesuré en alarme en A x 0,16) x 1,1 < Ah marqué sur les batteries.

**CMSI sans délestage** : (Courant mesuré en veille en A x 12 + Courant mesuré en alarme en A x 1) x 1,1 < Ah marqué sur les batteries.

**CMSI avec délestage** : (Courant mesuré en veille avant délestage en A x (nb minutes / 60) + Courant mesuré en veille après délestage en A x ((720 - nb minutes avant délestage) / 60) + Courant mesuré en alarme en A x 1) x 1,1 < Ah marqué sur les batteries.

Lors des vérifications de maintenance, la vérification des valeurs est à faire en la comparant à la valeur précédente.

Dérives acceptables par rapport aux valeurs d'origine enregistrées sur les étiquettes apposées sur les batteries :

- TENSION : Valeur précédente +/- 10%, INTENSITE : Valeur précédente +/- 20%.

# Observations complémentaires

| N° | Mesures et / ou remarques |
|----|---------------------------|
|    |                           |

*PAGE LAISSEE BLANCHE INTENTIONNELLEMENT*



**CHUBB France**  
Capital Social 32 302 720 € • RCS Pontoise 702 000 522  
Campus Saint Christophe - Bât. Edison 6 - 10 avenue de l'Entreprise  
95863 CERGY Cedex



[www.chubbfs.com/fr-fr](http://www.chubbfs.com/fr-fr)

AVERTISSEMENT : Soucieux de l'amélioration constante de nos produits qui doivent être mis en œuvre en respectant les réglementations en vigueur, nous nous réservons le droit de modifier à tous moments les informations contenues dans ce document. Le non-respect ou la mauvaise utilisation des informations contenues dans ce document ne peut en aucun cas impliquer notre société. Dans la mesure où les textes, dessins et modèles, graphiques, base de données reproduits dans ce document seraient susceptibles de protection au titre de la propriété intellectuelle et dès lors que le Code de la Propriété Intellectuelle n'autorise, au terme de l'article L122-5 2° et 3° a), d'une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement des auteurs ou de leurs ayants droit ou ayants cause est illicite (article L122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L335-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle.
